



Stavba: „Splašková kanalizace obce Markvartovice“

Zpráva zhotovitele o plánu prací ve 31. týdnu,
v období srpen 2016.


1. Stoka T, Š53 – Š53a (BT), ul. Šilheřovická;

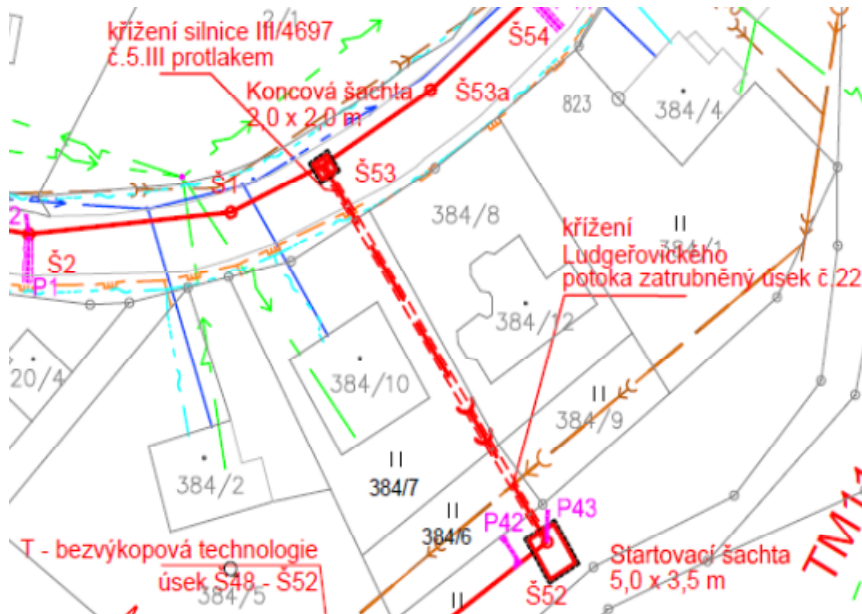


2. Stoka TM8, Š1 – Š4, ul. Dlouhá.

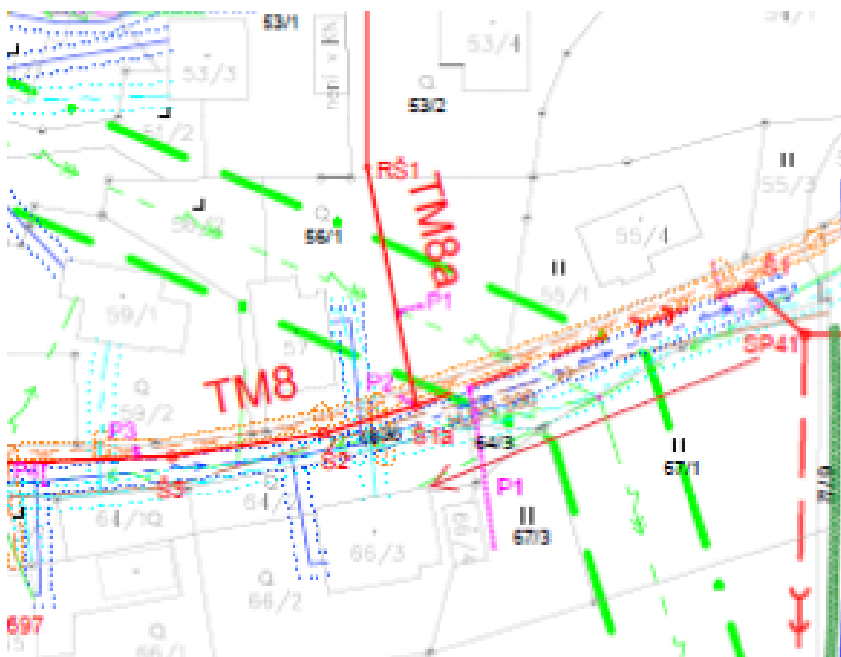


3. Stoka TM10, Š53 – Š1, ul. Šilheřovická.

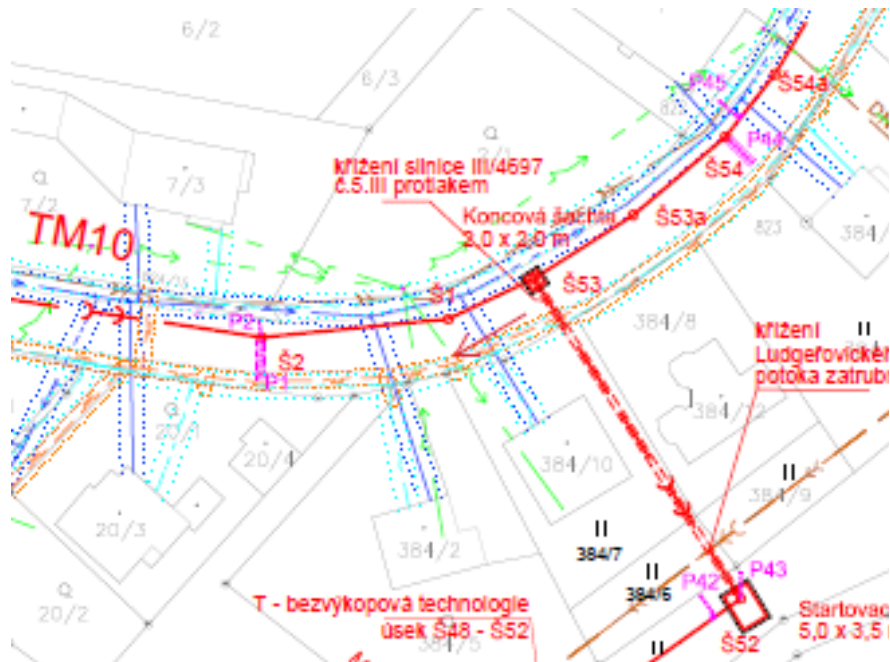


4. Stoka TM11(přípojky), ul. Školní

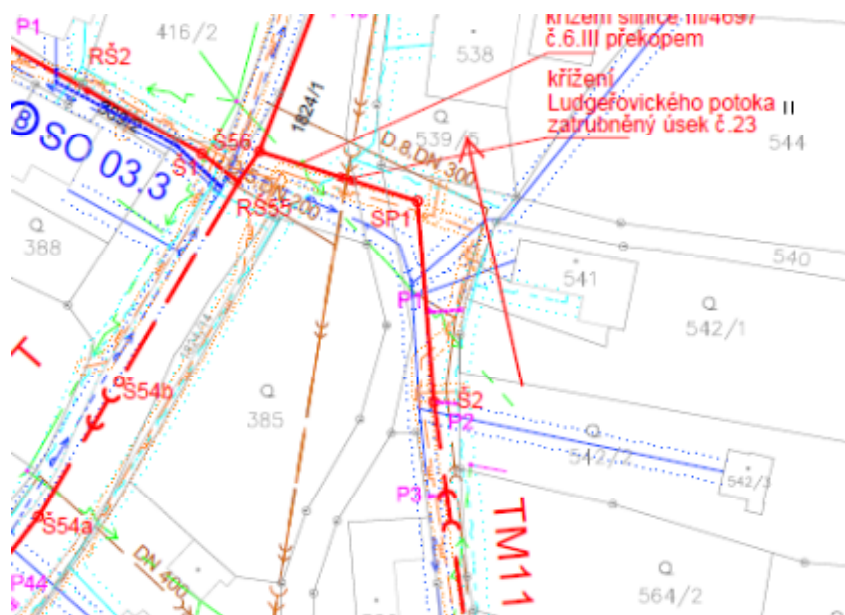


5. Stoka T v úseku Š37a – SP41; gabiony

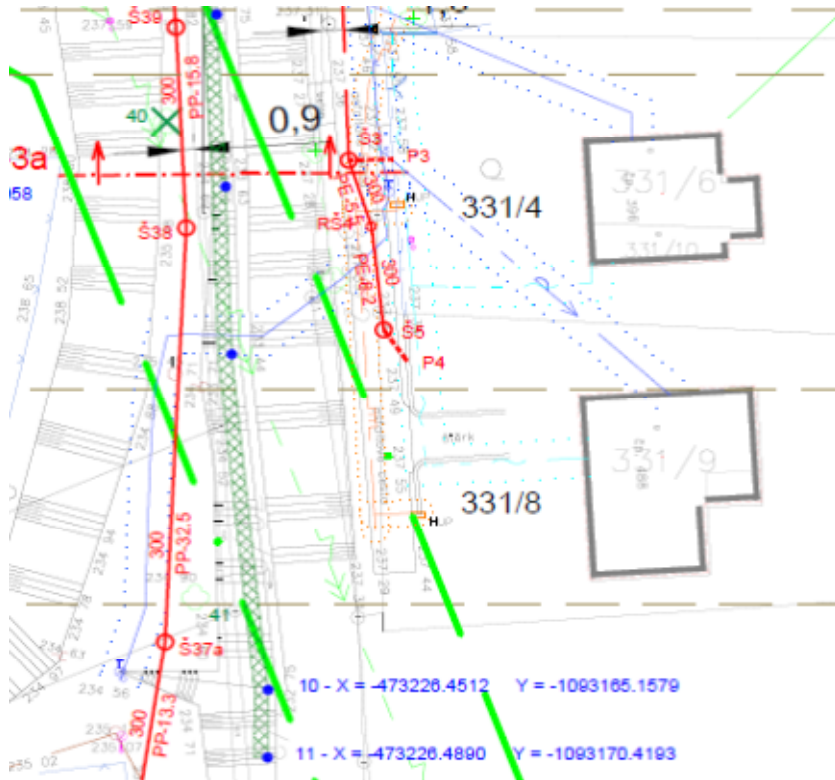

6. Stoka T, SP71 – Š71a, ul. Na Hřibovci

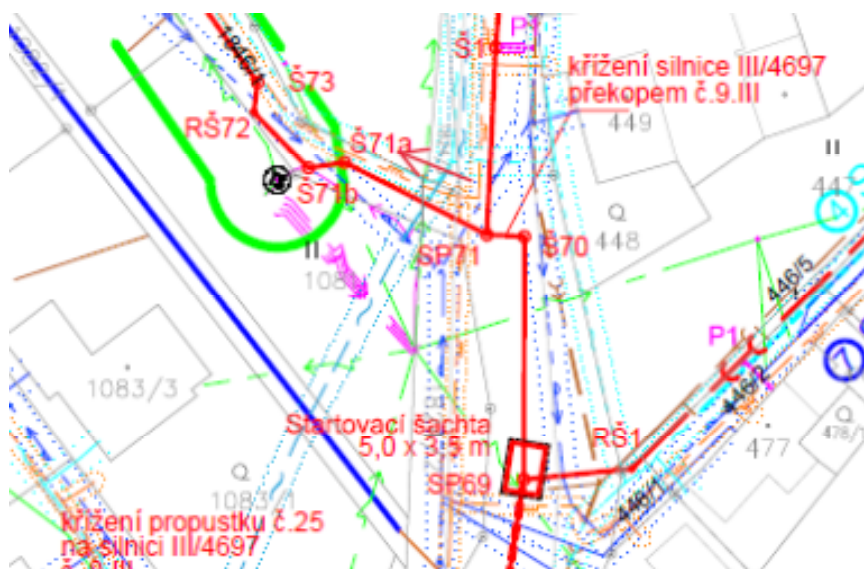

7. Stoka TM16a', ul. Stodolní

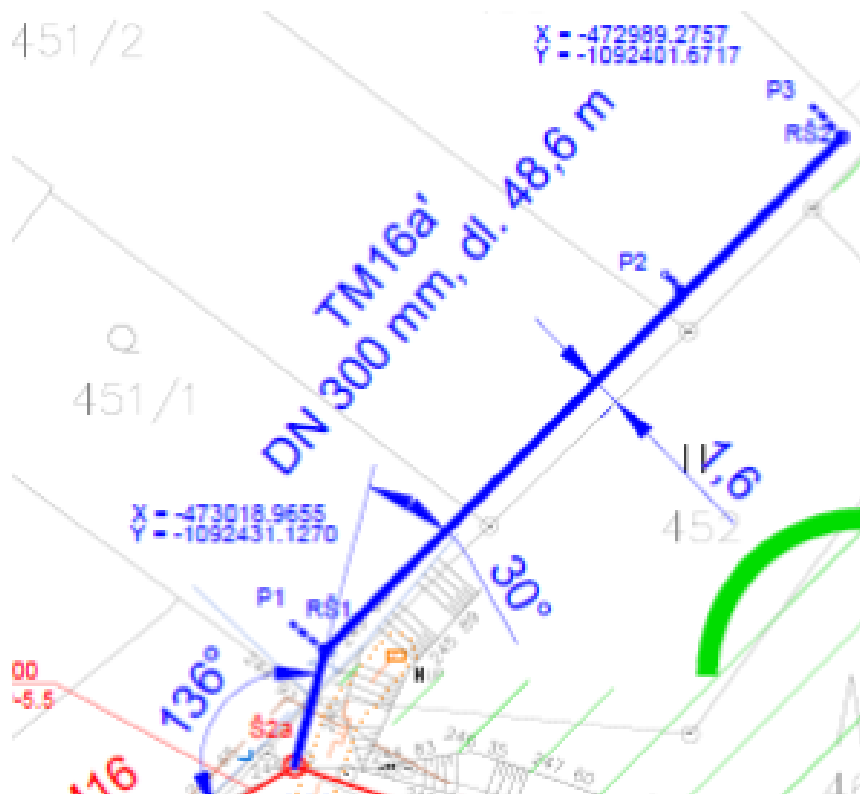

8. Na stokách TM15 (ul. Lipová), TM15c (ul. Ke Kapli), TM16 a TM16a (ul. Stodolní), bude ve dnech 25.7.- 07.8.2016 prováděna příprava na pokládku živice. Od 8. 8. – 11. 8. 2016 bude prováděna pokládka živice.
9. Na stokách TM7 a TM7c ul. Šilheřovická bude prováděno frézování živičného krytu a příprava na pokládku živice ve dnech 30.7. – 1.8.2016. Ve dnech 2. 8. – 4. 8. 2016 bude prováděna pokládka živice.

Vypracoval: Ing. Dančo Vasil

Datum: 29. 07. 2016
