



Stavba: „Splašková kanalizace obce Markvartovice“

Zpráva zhotovitele o plánu prací ve 32. týdnu,
v období srpen 2016.


1. Stoka TM8, Š1 – Š4, ul. Dlouhá.

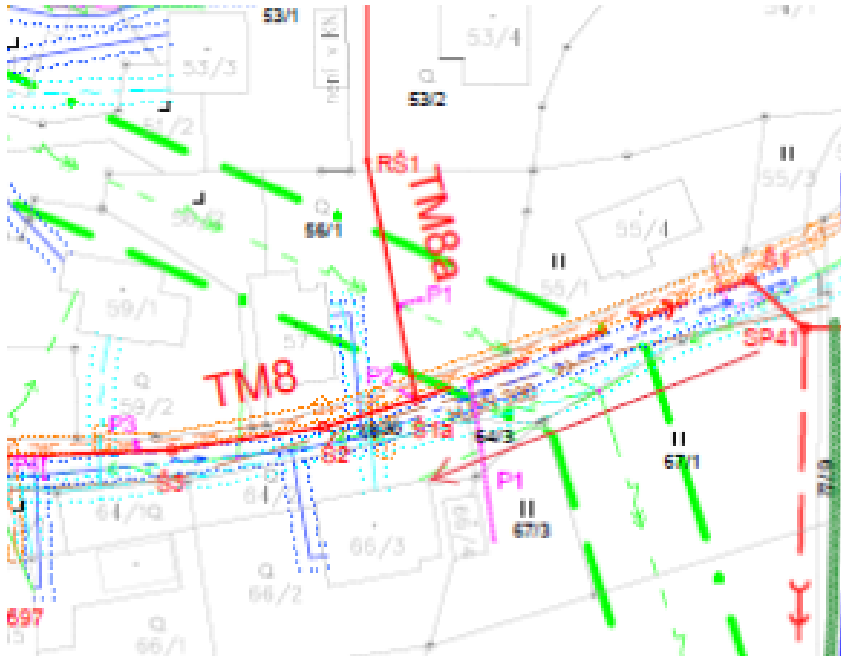


2. Stoka TM10, Š53 – Š1, ul. Šilheřovická.

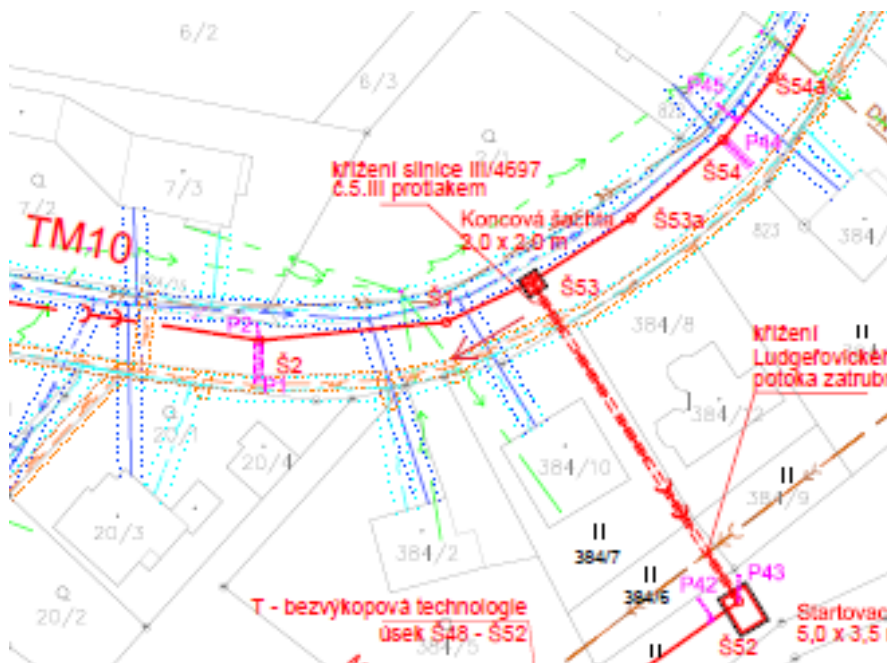


3. Stoka TM17(přípojky), ul. Šilheřovická

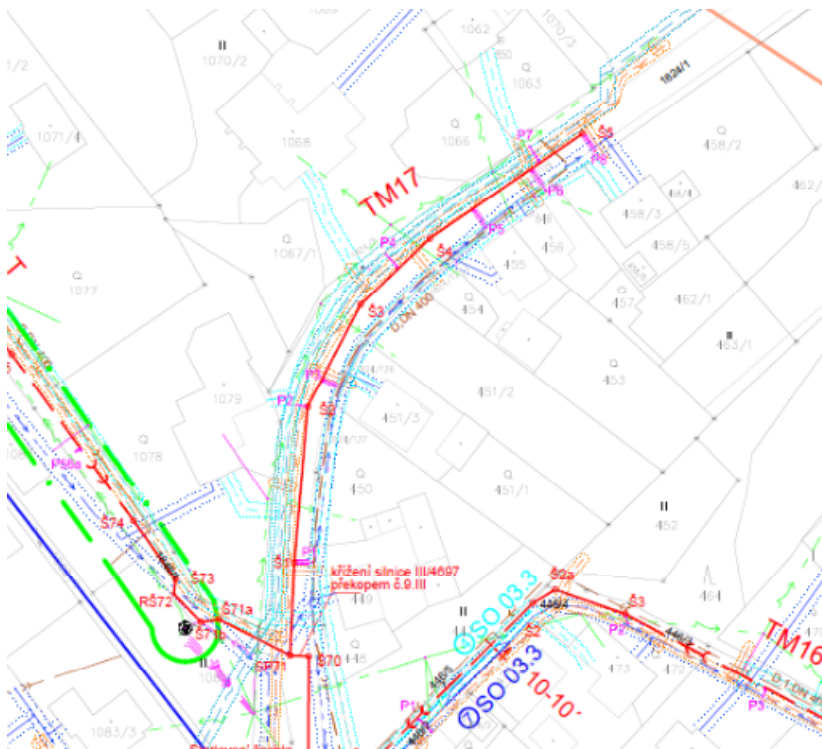

4. Stoka T v úseku Š37a – SP41; gabiony

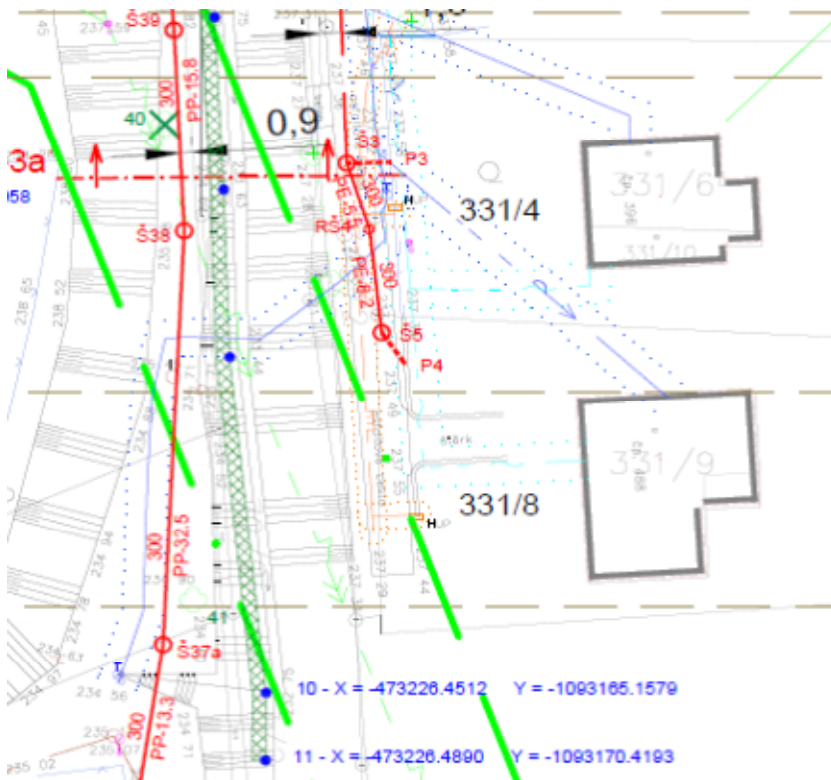

5. Stoka TM8a, Š1 – RŠ1, **ul. Dlouhá**

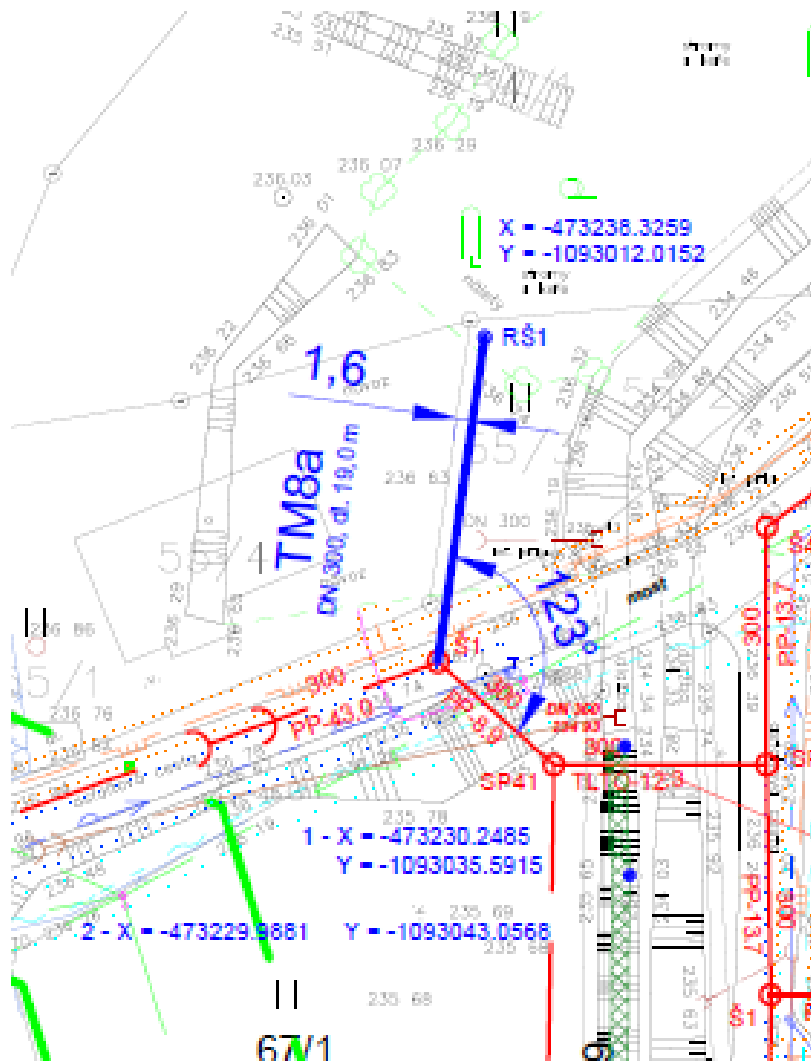

6. Na stokách TM15 (**ul. Lipová**), TM15c (**ul. Ke Kapli**), TM16 a TM16a (**ul. Stodolní**). Od 8. 8. – 11. 8. 2016 bude prováděna pokládka živice.

7. Na stokách TM8 a TM8c **ul. Šilheřovická** bude prováděno frézování živičného krytu a příprava na pokládku živice ve dnech 6.8. – 9.8.2016. Ve dnech 10. 8. – 12. 8. 2016 bude prováděna pokládka živice.
