



Stavba: „Splašková kanalizace obce Markvartovice“

Zpráva zhotovitele o plánu prací ve 33. týdnu,
v období srpen 2016.


1. Stoka TM8, (přípojky), ul. Dlouhá.

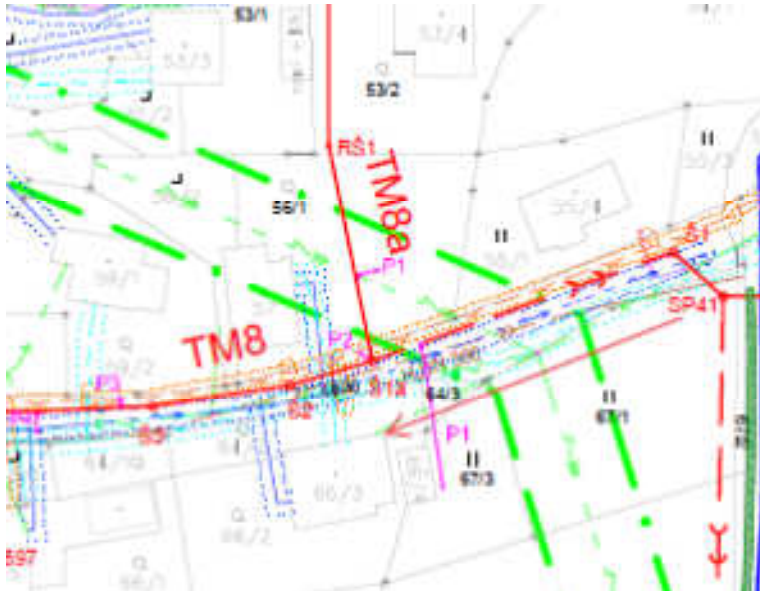

2. Stoka TM17, ul. Šilheřovická. Příprava na pokládku živice ve dnech 15 – 17.8 2016. Ve dnech 17 – 19.8 2016 bude prováděna pokládka živice.

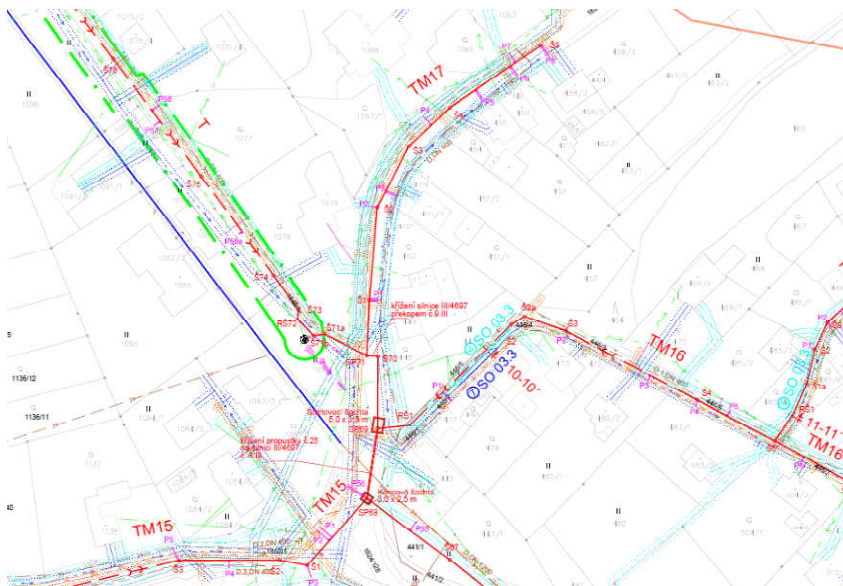

3. Stoka T v úseku Š37a – SP41; gabiony

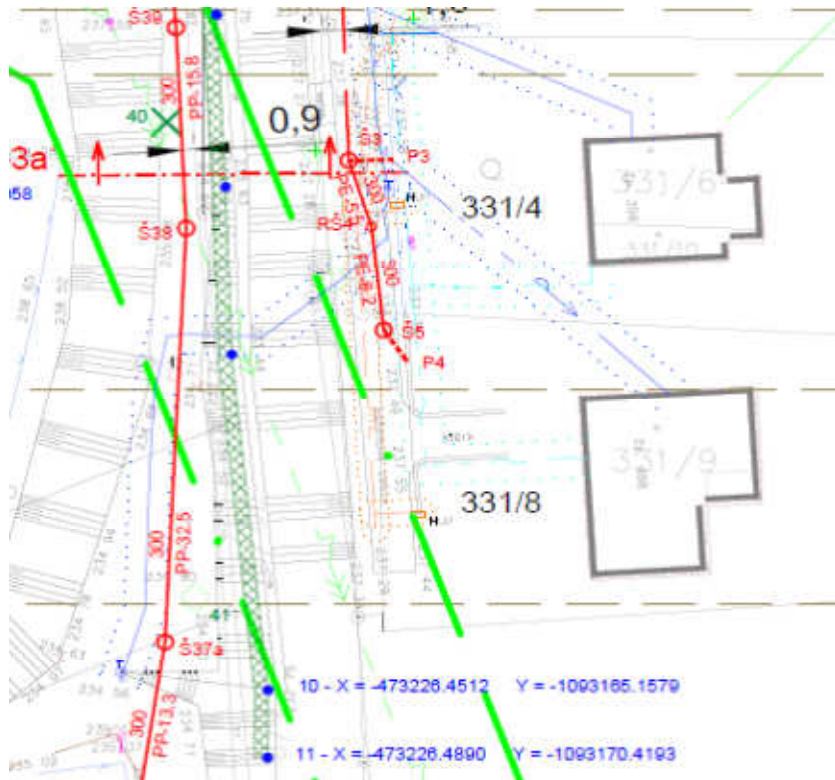

4. Stoka T v úseku RŠ 51 – RŠ 49 (BT)



5. Na stoce T (ul. Na Hřibovci), TM16 (ul. Stodolní). Bude prováděna příprava na pokládku živice ve dnech 15. 8. – 17. 8. 2016. Ve dnech 17.8 – 19.8 2016 bude prováděna pokládka živice.
6. Na stokách TM9 (ul. Dlouhá), TM 9a (Na Kopci), TM 29b (ul. Na Výsluní), TM 11 (ul. Školní) bude prováděna příprava na pokládku živice ve dnech 15.8. – 18.8.2016. Ve dnech 18. 8. – 19. 8. 2016 bude prováděna pokládka živice.

Vypracoval: Válek Milan

Datum: 12. 8. 2016
