


Stavba: „Splašková kanalizace obce Markvartovice“

Zpráva zhotovitele o plánu prací ve 34. týdnu,
v období srpen 2016.


1. Stoka T v úseku Š37a – SP41; gabiony

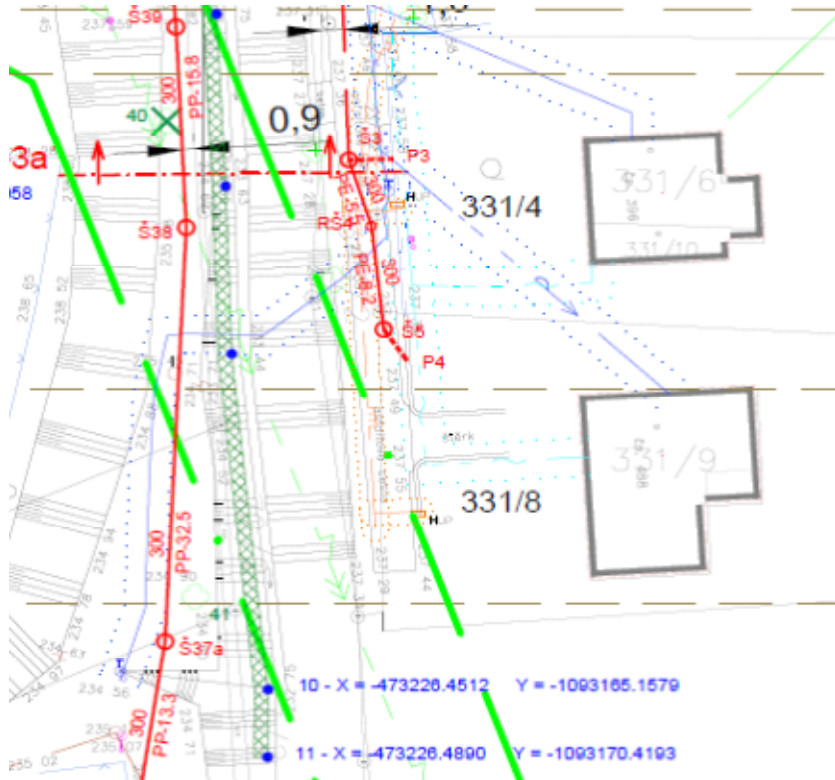

2. Stoka T, RŠ51 – RŠ50 výkopy + protlak, ul. Luční



3. Stoka T, SP71

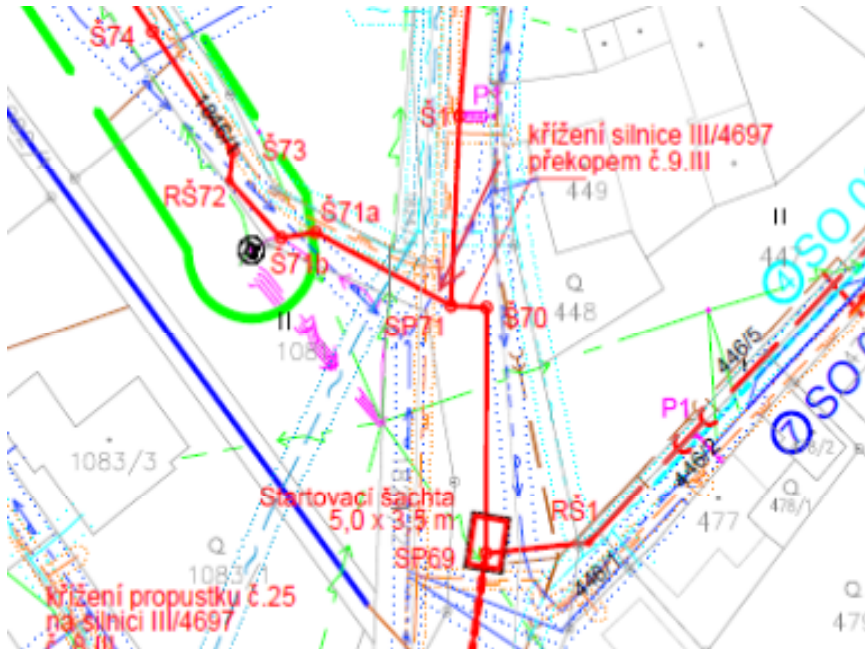

4. Stoka TM7 (práce na příčných překopech), ul. Šilheřovická



5. Na stokách TM11 (ul. Školní), TM9 (ul. Dlouhá), TM9a (ul. Na Kopci).
20. 8. – 22. 8. 2016 bude prováděno frézování živičného krytu a příprava na pokládku živice.

6. Na stokách TM10 a T (Š53 – Š65) ul. Šilheřovická bude prováděna příprava na pokládku živice. Ve dnech 24.8. – 27.8.2016 bude prováděna pokládka živice.

Vypracoval: Vasil Dančo

Datum: 19. 8. 2016
